

Departementet for Natur og Miljø

Att. Tilde Roland Høberg


Pinnngortitamut Avatangiisinullu
Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Natur og Miljø
P.O. Box 1614 3900 Nuuk
Telefon (299)345000
Email: pan@nanoq.gl

19. juni. 2020

Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet Ilulissat 3. kvartal 2020

Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; *boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden*. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Ilulissat skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnet tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 3. kvartal 2020. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for juli, august og september 2020.

Det vedlagte bilag 1 illustrerer det samlede projektareal, og samtidig viser sprængningsområdet for 3. kvartal 2020.

Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnet planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relaterer sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter.

Sprængningsaktiviteterne i 3. kvartal 2020 har til formål at anlægge anlægsvejen til projektområdet, samt et område til camp. Når anlægsvejen er etableret, er der skabt viden omkring fjeldet beskaffenhed, hvilket vil indgå i, hvordan resten af projektområdet skal udspørges, og i hvilke faser.

Sprængningsaktiviteten

Det påregnes, at der sprænges op til 92.500 m³ i 3. kvartal 2020 (1. juli til 30. september 2020).

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 3. kvartal 2020

Det planlægges, at borearbejdet vil pågå, i en periode fra mandag til lørdag (07 – 18), med mulighed for søndagen, i det område der skal sprænges.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 3. kvartal 2020.

Bilag 1

MUNCK GRUPPEN A/S
KDV/20200616

Ilulissat Lufthavn
SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Bilag 1
Munck Civil Engineering A/S
KDV/20200616
Ilulussat lufthavn
Bore- og sprængningsplan for 3. kvartal 2020



Tabel 1: Sprængningsvinduer for 3. kvartal 2020 - Område 1						
Farvekode:		Sommer			Vinter	
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Tidsrum:		18 til 22				
		18 til 22				

Supplerende sprængningsvinduer aftales løbende med lufthavnen (2 dages varsel)

Tabel 2: Sprængningsvinduer for 3. kvartal 2020 - Område 2						
Farvekode:		Sommer			Vinter	
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Tidsrum:		18 til 22				
		18 til 22				



Supplerende sprængningsvinduer aftales løbende med lufthavnen (2 dages varsel)

Tabel 3: Sprængningsvinduer for 3. kvartal 2020 - Område 3						
Farvekode:		Sommer			Vinter	
Dag:	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Tidsrum:		18 til 22				
		18 til 22				

Supplerende sprængningsvinduer aftales løbende med lufthavnen (2 dages varsel)

Signaturer

- Ny bane og terminal plan / New runway and terminal layout
- Eksisterende bane og terminal plan / Existing runway and terminal plan
- Dybde sprængningsområde / Deep Blasting area
- Nedsprængningsområde / Blasting area

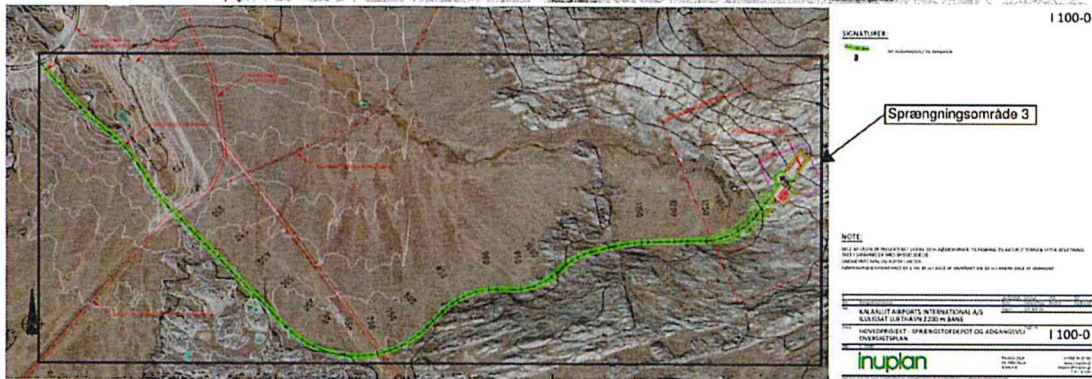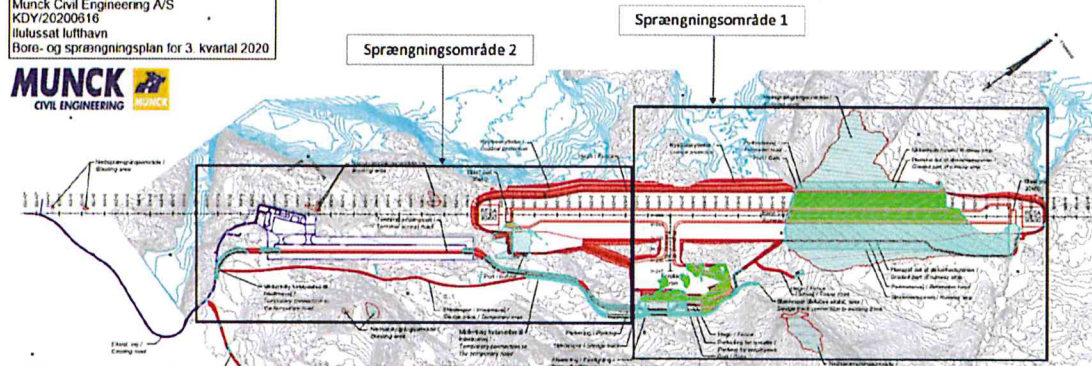

Arbejdernes områder:

Lufthavnen bygges i 3 faser, men projektområdets sprængningsarbejder i de 3 områder, som arbejdet skrider fremad:

- Sprængningsområde 1, bliver anvendt i september 2020
- Sprængningsområde 2, bliver anvendt fra juli 2020 til og med september 2020.
- Sprængningsområde 3, bliver anvendt i August 2020

Det forventes at der skal sprænges 92500 m³ i perioden.

Handwritten signature: Peter J. Pedersen
 Pinngortifamut Avatangiistinnullu
 Naalakkersuisoqarfik
 Departementet for Natur og Miljø
 P.O. Box 1614 3900 Nuuk
 Telefon (299) 015000
 Email: pan@natog.gl

SKALLET
 NOTER
 KVALITETSPROJEKT - SPRÆNGTILFØJST OG ARBEJDSPLAN
 inuplan

